BESIX Infra Nederland

gemeente Eijsden-Margraten

Uitvoeringsplanning Past. Kikkenweg V4

2025 2025

Task nr	Omschrijving werkzaamheden	Eenh.	Hoeveelheid
	Voorbereidende werkzaamheden		
1	Controleren hoogten en hoogteplan	1	maal
2	Voorbereiding uitvoering	1	maal
3	Verstrekken bewonersbrief	1	maal
4	Aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregelen	1	maal
5	Nulmeting toestand perceel (incl. grondonderzoek)	1	maal
6	Ontgraven grond bypass	1	maal
7	Aanbrengen doek bypass	1	maal
8	Aanbrengen menggranulaat bypass	1	maal
9	Plaatsen unit en container	1	maal
10	Aanbrengen rijplaten	1	maal
	Communicatie en omgeving		
11	Aanmaken bouwapp	1	maal
12	Plaatsen vooraankondigingsborden	1	maal
13	Melding fases bij hulpdiensten	1	maal
14	Bewonersbrief	1	maal
15	Overleg/omvorm ondernemers	1	maal
	Fase 1 Pastoor Kikkenweg Zuid en eerste 15 m1 Pastoor Kikkenweg Noord	**20**	**dag**
16	Aanbrengen tijdelijke verkeersmaaatregelen	1	maal
17	Uitzetten zaaglijnen t.b.v. kantopsluitingen, huisaansluitingen, kolkaansluitingen, kolken en putranden	467	m1
18	Zagen asfalt t.b.v. kantopsluitingen, huisaansluitingen, kolkaansluitingen, kolken en putranden	467	m1
19	Opbreken straatwerk	110	m2
20	Opbreken asfalt	82	m2
21	Verwijderen kolken	7	stuks
22	Aanbrengen nieuwe huisaansluitingen RWA	7	stuks
23	Aanbrengen nieuwe huisaansluitingen DWA	6	stuks
24	Aanbrengen kolkaansluitingen (ook Heerderweg)	8	stuks
25	Aanbrengen mantelbuizen	2	stuks
26	Grondwerk opsluitbanden	263	m1
27	Grondwerk t.b.v. molgoten en geleiders	82	m2
28	Ecologische begeleiding (OG)	1	maal
29	Aanbrengen opsluitbanden 10x20	278	m1
30	Aanbrengen molgoot	256	m1
31	Aanbrengen trottoirbanden inclusief dubbele strek	13	m1
32	Aanbrengen kolken (ook Heerderweg)	5	stuks
33	Grondwerk t.b.v. straatwerk	130	m2
34	Verwijderen putranden	8	stuks
35	Aanbrengen putranden O-Line	6	stuks
36	Herstellen putrand of nieuw	3	stuks
37	Aanbrengen straatwerk strook achter molgoot	125	m2
38	Frezen asfalt deklaag inclusief aansluitingen deklaag	1	maal
39	Frezen tussenlaag	478	m2
40	Reinigen asfalt	890	m2
41	Herstraten inritten	37,5	m2
42	Aanbrengen SAMI	478	m2
43	Aanbrengen onderlaag t.p.v. huisaansluitingen, mantelbuizen, putranden en kolken	7	M2
44	Aanbrengen asfalt tussenlaag	548	m2
45	Aanbrengen asfalt deklaag	920	m2
46	Aanbrengen palen en verkeersborden	3	stuks
47	Afwerken en inzaaien bermen	347	m2
48	Aanbrengen wegmarkeringen	1	maal
49	Aanbrengen rode coatingen	265	m2
50	Opruimen werkterrein	1	maal
51	Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen	1	maal
	Fase 2A Heerderweg	**10**	**dag**
52	Aanbrengen tijdelijke verkeersmaaatregelen	1	maal
53	Uitzetten zaaglijnen t.b.v. kantopsluitingen, huisaansluitingen, kolkaansluitingen, kolken en putranden	7	m1
54	Zagen asfalt t.b.v. kantopsluitingen, huisaansluitingen, kolkaansluitingen, kolken en putranden	7	m1
55	Opbreken straatwerk	65	m2
56	Opbreken asfalt	177	m2
57	Verwijderen kolken	1	stuks
58	Aanbrengen kolkaansluitingen	1	stuks
59	Grondwerk t.b.v. straatwerk	242	m2
60	Grondwerk t.b.v. molgoten	130	m1
61	Aanbrengen molgoot	130	m1
62	Verwijderen putranden	4	stuks
63	Aanbrengen putranden nieuw	4	stuks
64	Aanbrengen kolken	1	stuks
65	Aanbrengen straatwerk rijbaan	203	m2
66	Opruimen werkterrein	1	maal
67	Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen	1	maal
	Fase 2B Heerderweg	**10**	**dag**
67	Aanbrengen tijdelijke verkeersmaaatregelen	1	maal
68	Uitzetten zaaglijnen t.b.v. kantopsluitingen, huisaansluitingen, kolkaansluitingen, kolken en putranden	215	m1
69	Zagen asfalt t.b.v. kantopsluitingen, huisaansluitingen, kolkaansluitingen, kolken en putranden	215	m1
70	Opbreken straatwerk	62	m2
71	Opbreken asfalt	121	m2
72	Verwijderen kolken	2	stuks
73	Aanbrengen nieuwe huisaansluitingen RWA	3	stuks
74	Aanbrengen nieuwe huisaansluitingen DWA	3	stuks
75	Aanbrengen kolkaansluitingen	2	stuks
76	Bestaande huisaansluiting Heerderweg 1 beoordelen en indien nodig herstellen	1	stuks
77	Grondwerk t.b.v. straatwerk	108	m2
78	Grondwerk opsluitbanden	140	m1
79	Grondwerk t.b.v. molgoten	191	m1
80	Aanbrengen molgoot	191	m1
81	Verwijderen putranden	8	stuks
82	Handhaven kolk indien nodig stellen	2	stuks
83	Aanbrengen kolken	4	stuks
84	Aanbrengen opsluitbanden 10x20	140	m1
85	Aanbrengen putranden nieuw	4	stuks
86	Grondwerk t.b.v. straatwerk	127	m2
87	Aanbrengen putranden O-Line	4	stuks
88	Aanbrengen straatwerk strook achter molgoot	108	m2
89	Aanbrengen palen en verkeersborden	1	stuks
90	Aanbrengen schrikhekken	2	stuks
91	Afwerken en inzaaien bermen	62	m2
92	Frezen asfalt deklaag	645	m2
93	Frezen tussenlaag	645	m2
94	Reinigen asfalt	645	m2
95	Herstraten inritten en trottoirs indien nodig	70	m2
96	Aanbrengen SAMI	121	m2
97	Aanbrengen onderlaag t.p.v. huisaansluitingen, mantelbuizen, putranden en kolken	7	m2
98	Aanbrengen asfalt tussenlaag	544	m2
99	Aanbrengen asfalt deklaag	667	m2
100	Aanbrengen wegmarkeringen	1	maal
101	Aanbrengen rode coatingen	122	m2
102	Opruimen werkterrein	1	maal
103	Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen	1	maal
	Fase 3 Pastoor Kikkenweg Noord	**15**	**dag**
104	Aanbrengen tijdelijke verkeersmaaatregelen	1	maal
105	Uitzetten zaaglijnen t.b.v. kantopsluitingen, huisaansluitingen, kolkaansluitingen, kolken en putranden	381	m1
106	Zagen asfalt t.b.v. kantopsluitingen, huisaansluitingen, kolkaansluitingen, kolken en putranden	381	m1
107	Opbreken straatwerk en halfverharidingen	251	m2
108	Opbreken asfalt	100	m2
109	Verwijderen kolken	8	stuks
110	Aanbrengen nieuwe huisaansluitingen RWA	3	stuks
111	Aanbrengen nieuwe huisaansluitingen DWA	1	stuks
112	Aanbrengen kolkaansluitingen	10	stuks
113	Verplaatsen lichtmast (derden)	1	stuks
114	Grondwerk t.b.v. molgoten en geleiders	224	m1
115	Aanbrengen opsluitbanden 10x20	86	m1
116	Aanbrengen molgoot	136	m1
117	Aanbrengen trottoirbanden inclusief dubbele strek en inritconstructies	88	m1
118	Aanbrengen kolken	10	stuks
119	Verwijderen putranden	6	stuks
120	Aanbrengen putranden O-Line	4	stuks
121	Herstellen putrand of nieuw	2	stuks
122	Grondwerk t.b.v. straatwerk	294	m2
123	Aanbrengen straatwerk strook achter molgoot	66	m2
124	Aanbrengen straatwerk trottoirs en inritten	228	m2
125	Frezen asfalt deklaag inclusief aansluitingen deklaag	857	m2
126	Frezen tussenlaag	704	m2
127	Reinigen asfalt	857	m2
128	Herstraten inritten en trottoirs indien nodig	108	m2
129	Aanbrengen palen en verkeersborden	2	stuks
130	Aanbrengen SAMI	634	m2
131	Aanbrengen onderlaag t.p.v. huisaansluitingen, mantelbuizen, putranden en kolken	7	m2
132	Aanbrengen asfalt tussenlaag	634	m2
133	Aanbrengen asfalt deklaag	787	m2
134	Aanbrengen wegmarkeringen	1	maal
135	Aanbrengen rode coatingen	153	m2
136	Afwerken en inzaaien bermen	0	m2
137	Opruimen werkterrein	1	maal
138	Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen	1	maal
	Afronderde werkzaamheden		
138	Verwijderen unit en container	1	maal
139	Verwijderen rijplaten	1	maal
140	Verwijderen menggranulaat	1	maal
141	Verwijderen doek	1	maal
142	Verwerken en afwerken grond	1	maal
143	Eindmeting toestand perceel (incl. grondonderzoek)	1	maal
144	Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen	1	maal

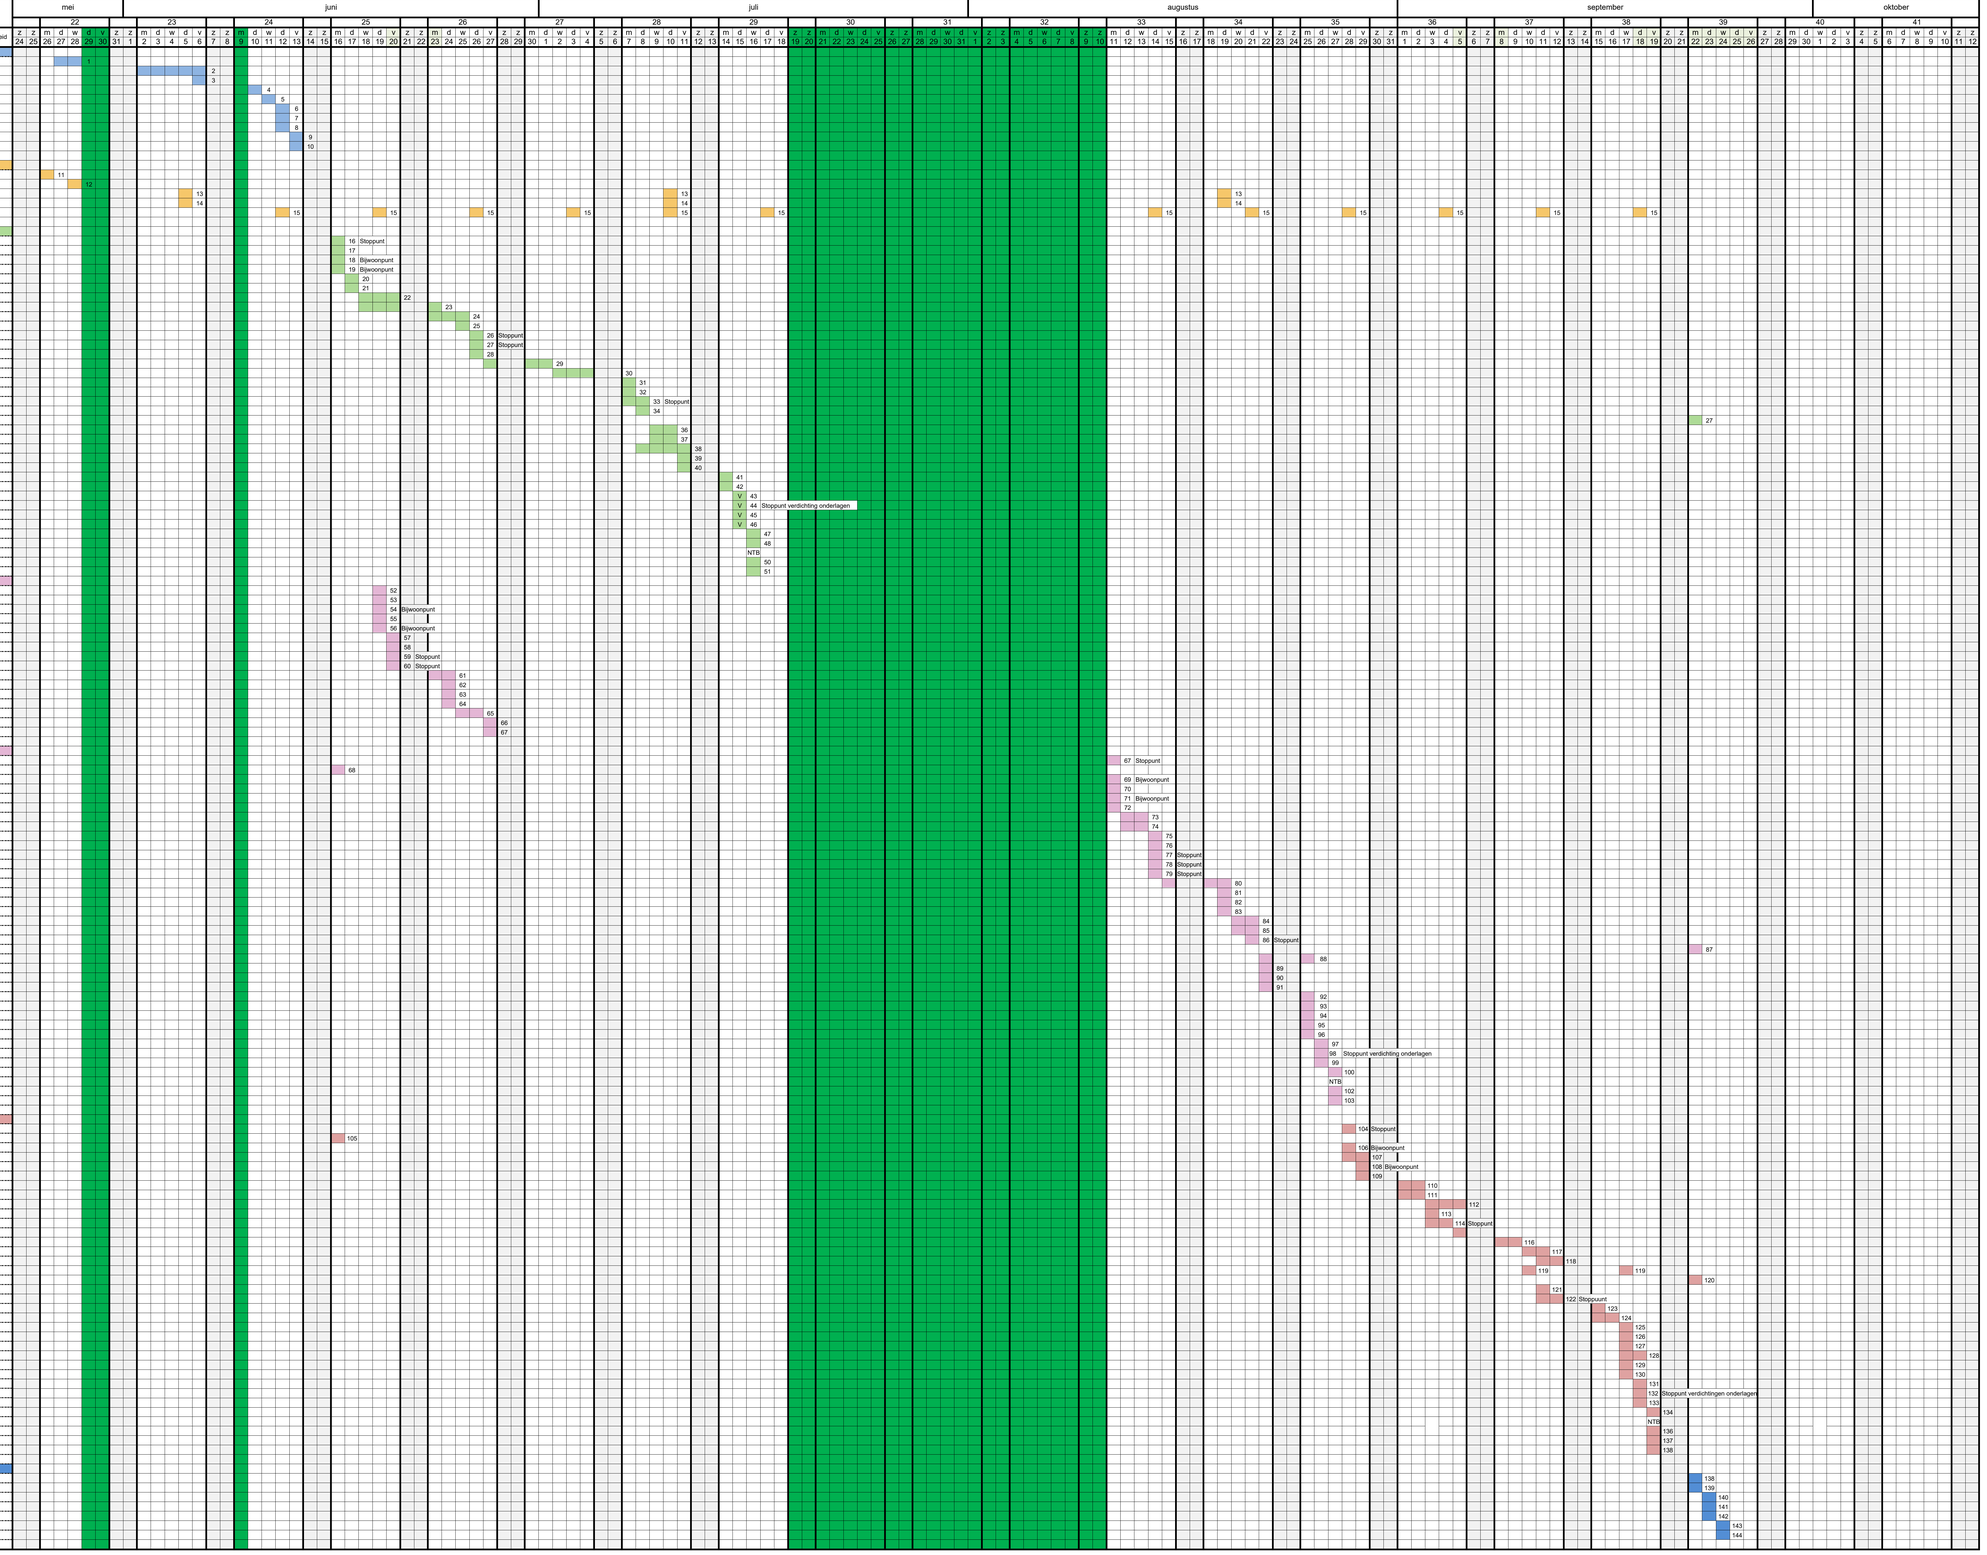

D.D. 08-05-25
